



TILLYKKE MED DERES NYE BRÆNDELY!

Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten.

INDHOLD

Materialeliste	2
General vejledning til afsætning	3-5
Montageforløb og arbejdsvejledning	6-10
Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail	11-16
Generel vejledning til behandling af trykimprægneret træ	17
Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne	17




Materialeliste:

Beskrivelse		Antal	Enhed	Anvendelse
Stolper	4/300	13,2	meter	Stolper
Høvlet reglar	2/240	4,8	meter	Rem
Bræddebolte VFZ	<i>Forbrug: 4 stk.</i>	1	pk	Rem vs. Stolper
Høvlet reglar	3/420	12,6	meter	Løsholte
Lægter	1/540		meter	Lægter
Vinkelbeslag m/ribbe		18	stk	Løsholte/stolper
Beslagsskruer	<i>Forbrug: 180 stk.</i>	1	pk	Beslag
Udendørs skruer	<i>Forbrug: 15 stk.</i>	1	pk	lægter
Brædder	1/300 + 1/360	6,6	meter	Stern
Hegnsbrædder	1/300	3	meter	Vindkryds
Hegnsbrædder	29/210	60,9	meter	Beklædning
Udendørs skruer	<i>Forbrug: 200 stk.</i>	1	pk	Beklædning
Trapezplader Blå 109x240 cm		1	stk	Tag
Bundskruer		1	pk	Tagplader


GENERAL VEJLEDNING TIL AFSÆTNING

Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund.

Efter man først har sikret sig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love, byplanbestemmelser, evt. byggevedtægt og andre bestemmelser, og der er indhentet byggemyndighedens tilladelse, kan afsætningen på grunden påbegyndes. For at få bygningen placeret korrekt på grunden, findes de nødvendige skelpæle.

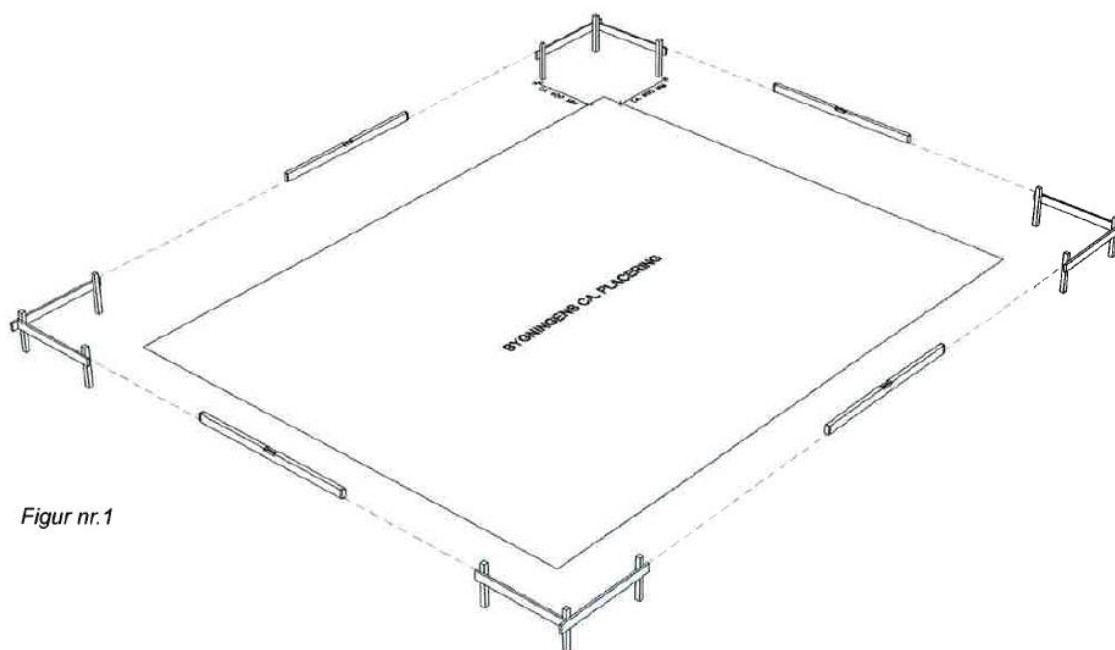


Figur nr.1


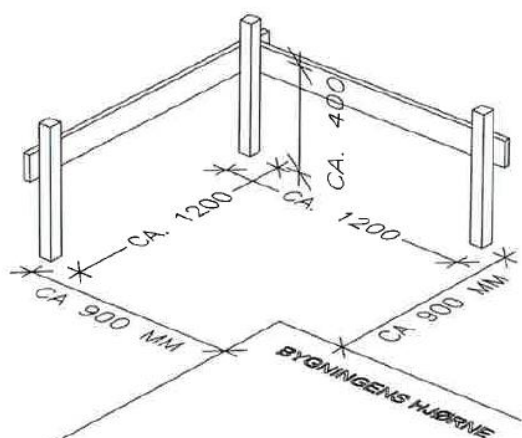


Figur nr.2


Bygningens forventede hjørner markeres med 4 pæle, der placeres efter en grov opmåling. Efterfølgende placeres de 4 galger. Det er af allerstørste vigtighed, at galgernes overliggere er i vatter, og at de indbyrdes er placeret i nøjagtig samme højde. (Figur 1 og 2)

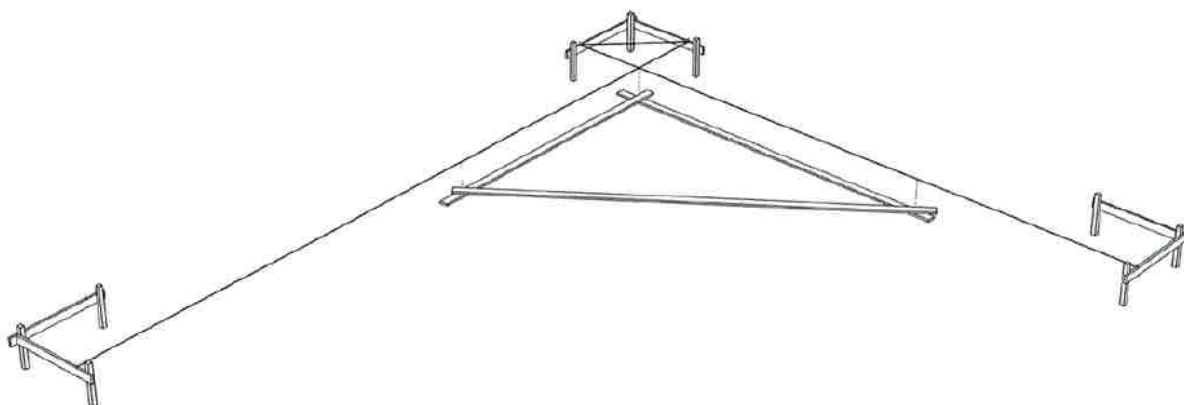

Figur nr.3



Figur nr.4

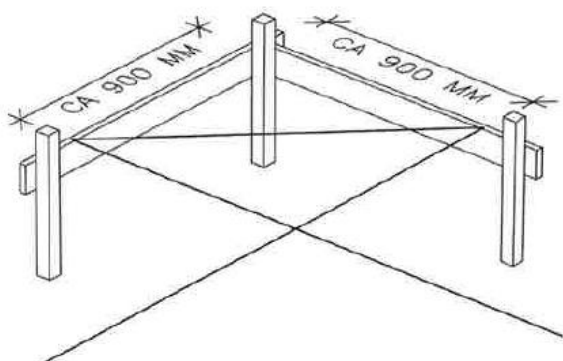


Figur nr.5

Først findes den præcise placering af enten bygningens ene facade eller gavl (fig. 3). Gavl eller facade kan findes ved at afsætte linjen i forholdt til skel. Linien afsættes på galgerne og markeres med søm/skru på overliggerne, hvorefter der trækkes en snor mellem sømmene/skrue (medfølger ikke).

Vær opmærksom på, at det er målene udvendigt på bygningens stolper, der skal afsættes, så stolperne kan placeres uden, at snorene skal fjernes. Så bestemmes det hjørne, hvor man er helt sikker på placeringen (fig. 3). Den vinkelrette sides placering bestemmes og markeres med et søm/skrue på galgen. Linien markeres med en snor. Til den præcise placering af den vinkelrette linje anbefales det at konstruere en vinkel som vist på fig. 4

En vinkel der er 3 m på den ene led og 4 meter på den anden led vil altid være 5 m på den diagonale led, og vil altid danne en ret vinkel (fig. 4). Størrelsen på vinklen vil minimere risikoen for en forkert afsættelse. Vær meget omhyggelig med at konstruere vinklen, da ganske små unøjagtigheder kan være afgørende.

Kan skelpælene ikke lokaliseres, kan man alternativt måle i forhold til en eksisterende bygning på grunden, som man med sikkerhed ved er placeret korrekt. Det anbefales dog altid at forholde sig til skel.

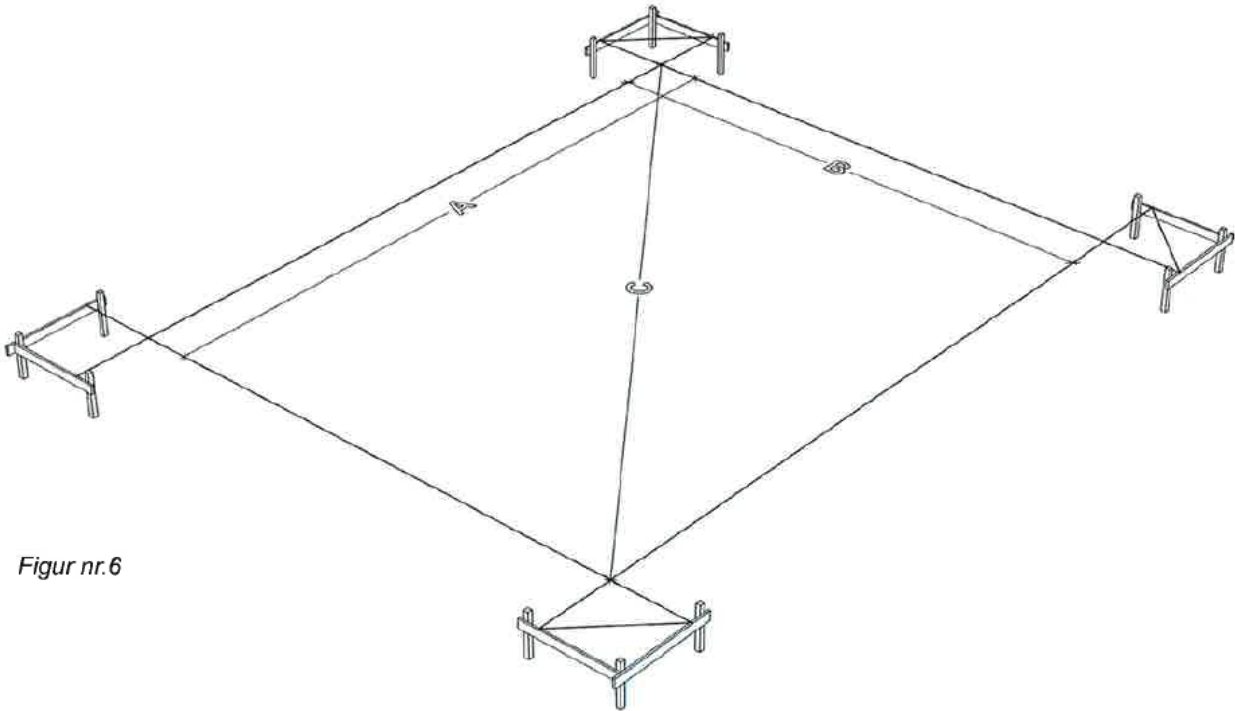

Figur nr. 6

Mål

A = 950 mm

B = 2168 mm

C = 2367 mm


Der er nu dannet en præcis 90° vinkel mellem de to linjer, hvor krydset mellem linjerne danner det første udvendige hjørne af bygningen. Længden af henholdsvis den ene gavl og den ene facade kan udmåles fra dette hjørne ud af snorene.

Herfra trækkes der yderlig to snore (fig. 6), hvor krydset mellem disse vil danne det fjerde og sidste hjørne på bygningen.

Det er nu vigtigt at kontrollere, at bygningen er korrekt afsat. Målene mellem de diagonale hjørner skal være præcis ens. Hvis dette ikke er tilfældet, skal afsætningen kontrolleres fra start til slut gennem alle faserne.

Vær opmærksom på, at fundamentplanens mål angiver afstanden mellem midten af stolperne.


Når afsætningen er færdig, kontrolleres endnu en gang, at alle mål (inkl. diagonal mål) er rigtige.

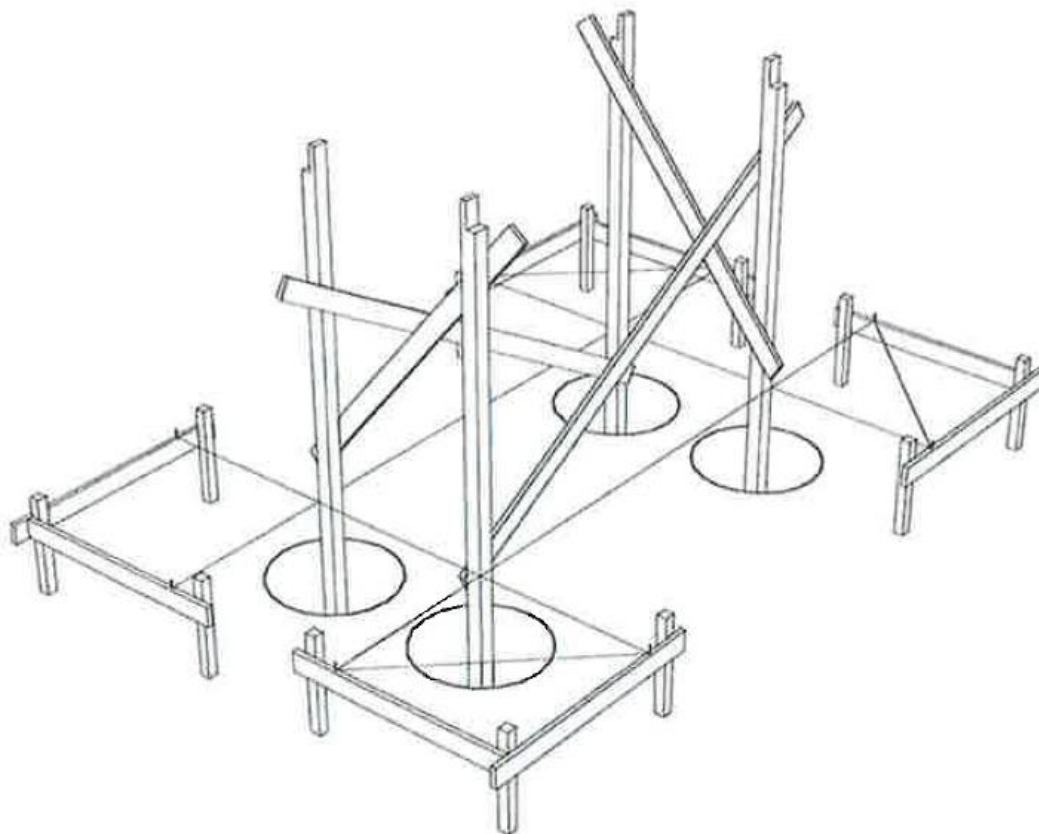Montageforløb og arbejdsvejledning


Stolperne tildannes i længden og placeres i hullerne. Stolperne tildannes i toppen, så der dannes et hak på 45 x 125 mm til placering af remmene.

Vær opmærksom på, at hakkene til remmene er placeret som vist på tegningen. Da snorene er placeret vandret, kan man med fordel finde stolpens top i forhold til snoren og markere det på stolpen. Det gør det nemmere at placere stolpen korrekt i højden.

Der udføres midlertidig afstivning af øvrige stolper. Den midlertidige afstivning kan udføres enten med stiksøm, skruer eller med skruetvinger. På dette stade sørges der for, at alle stolper er placeret i lod og korrekt højde. Det er af stor vigtighed, for etableringen af vindkryds. Vær opmærksom på, at midlertidig afstivning ikke kommer til at sidde i vejen for den efterfølgende montering.

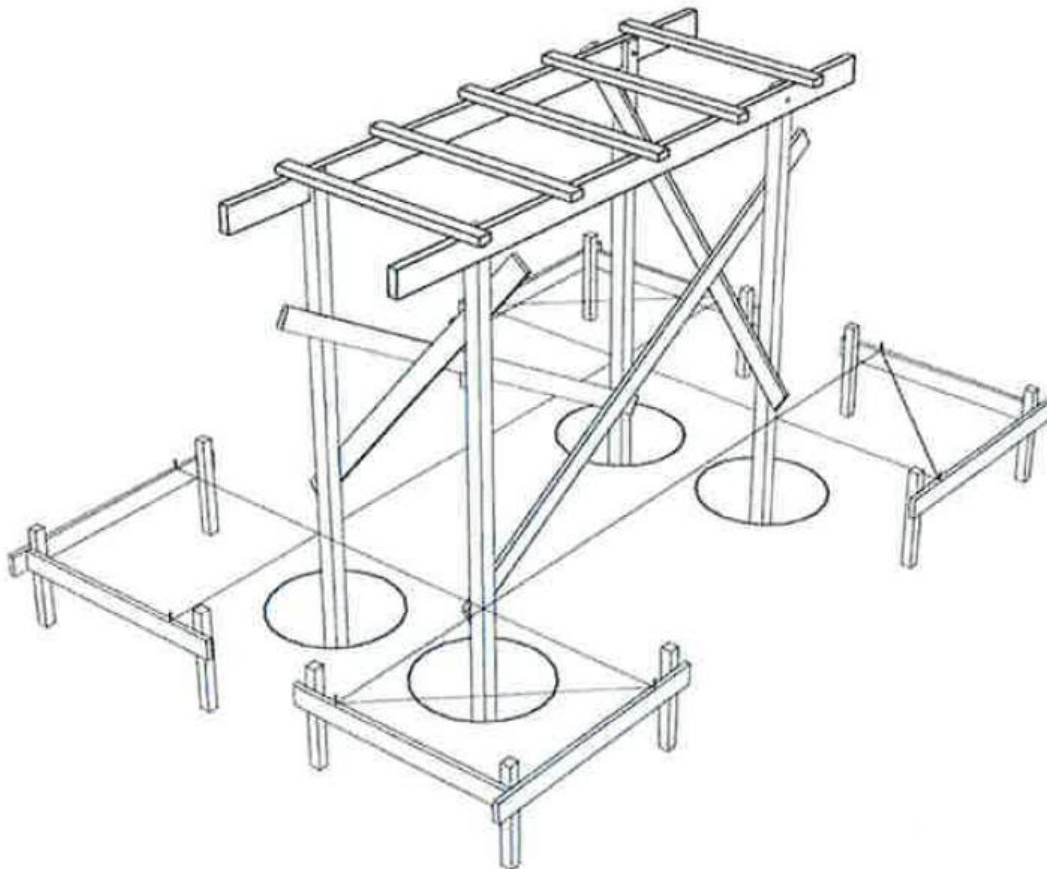

Remme monteres i overensstemmelse med tegninger.
Efterfølgende monteres spær.
Spærrene fastgøres over remmene med skruer
Vær opmærksom på at vende vinklen korrekt

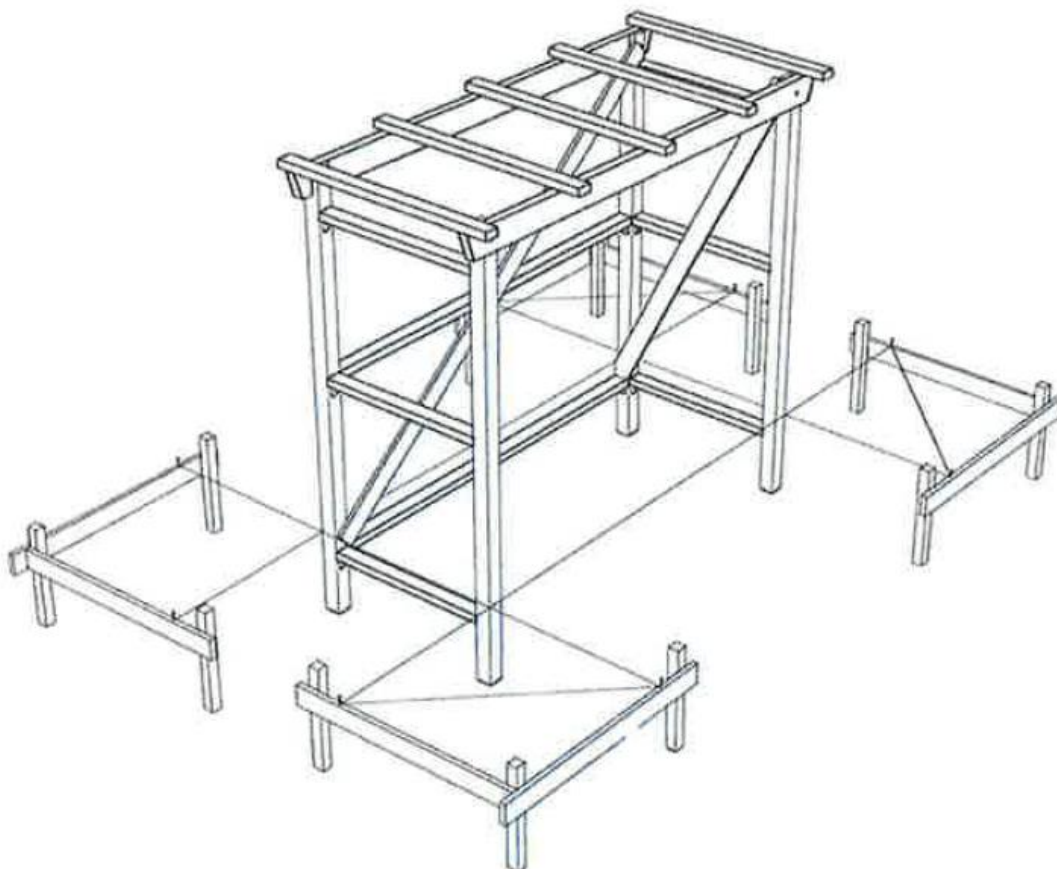

Efter spærene er monteret, monteres mellemstykker mellem de yderste spær i begge ender.

Efterfølgende monteres der løsholter i henhold til tegninger, og der monteres ligeledes vindkryds i 2 vægge.

Der fyldes til omkring stolper.
Vær opmærksom på at få stampet godt på alle sider af stolperne, løbende som der fyldes til.

Der er vigtigt at stampe ens på alle sider, så der ikke rækkes ved stolpens lod og højde. Som tilfyld omkring stolper skal anvendes drænende materiale, dvs. sand eller en kombination af sand og småsten.

Man kan ligeledes fylde delvist til med tørbeton i bunden af stolperne/hullerne.



Sternen monteres som angivet på detailtegning
bagerst i materialet.


Trapezpladen placeres mod sternbrættet på
tagfladens højeste punkt og monteres iht.
leverandørens anvisning bagerst i materialet.





Der monteres lodret beklædning. Inden montering måles beklædningsfladerne op, og der laves en ligelig inddeling af brædderne.


Se detailtegning bagerst i materialet

Læg endvidere mærke til, hvordan brædderne skal vende. Det er vigtigt at brædderne vender som angivet på detailtegningen.

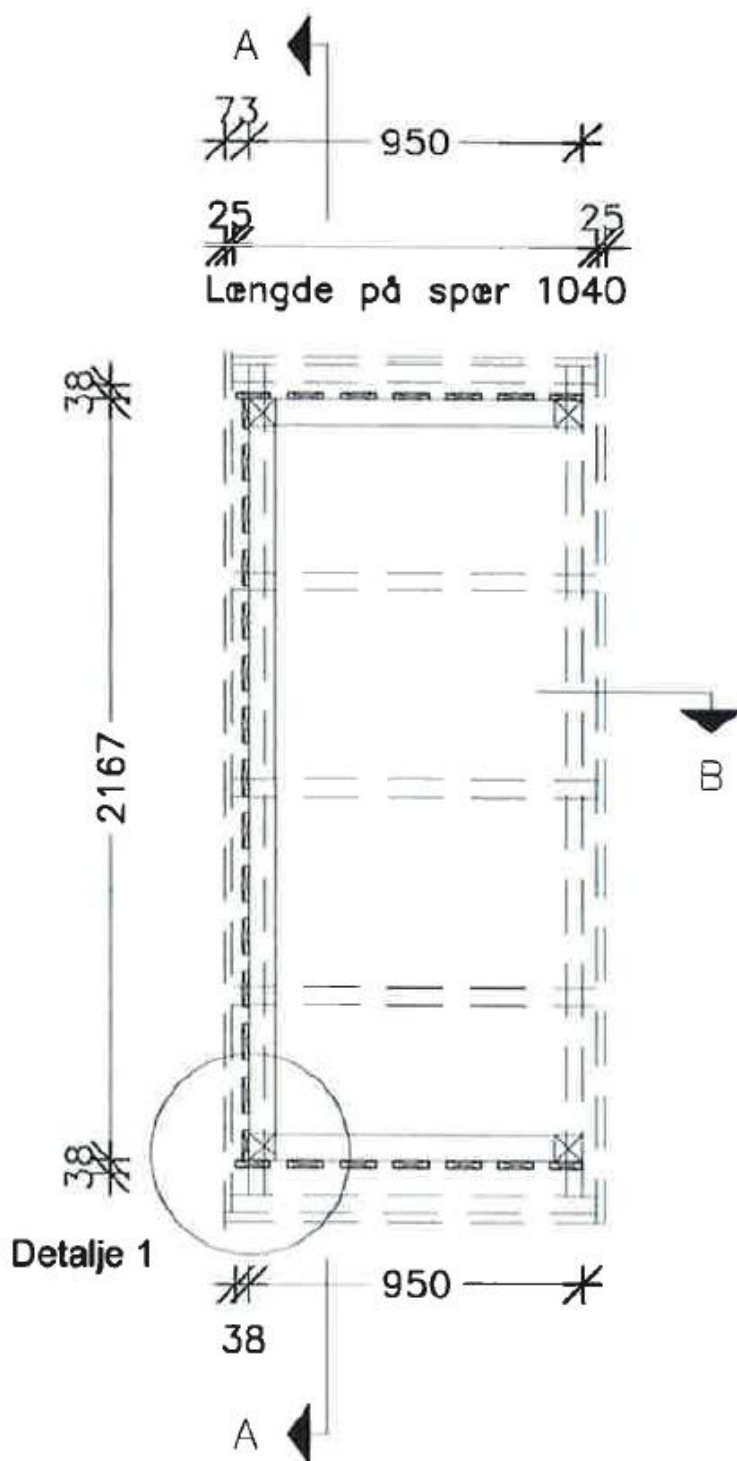


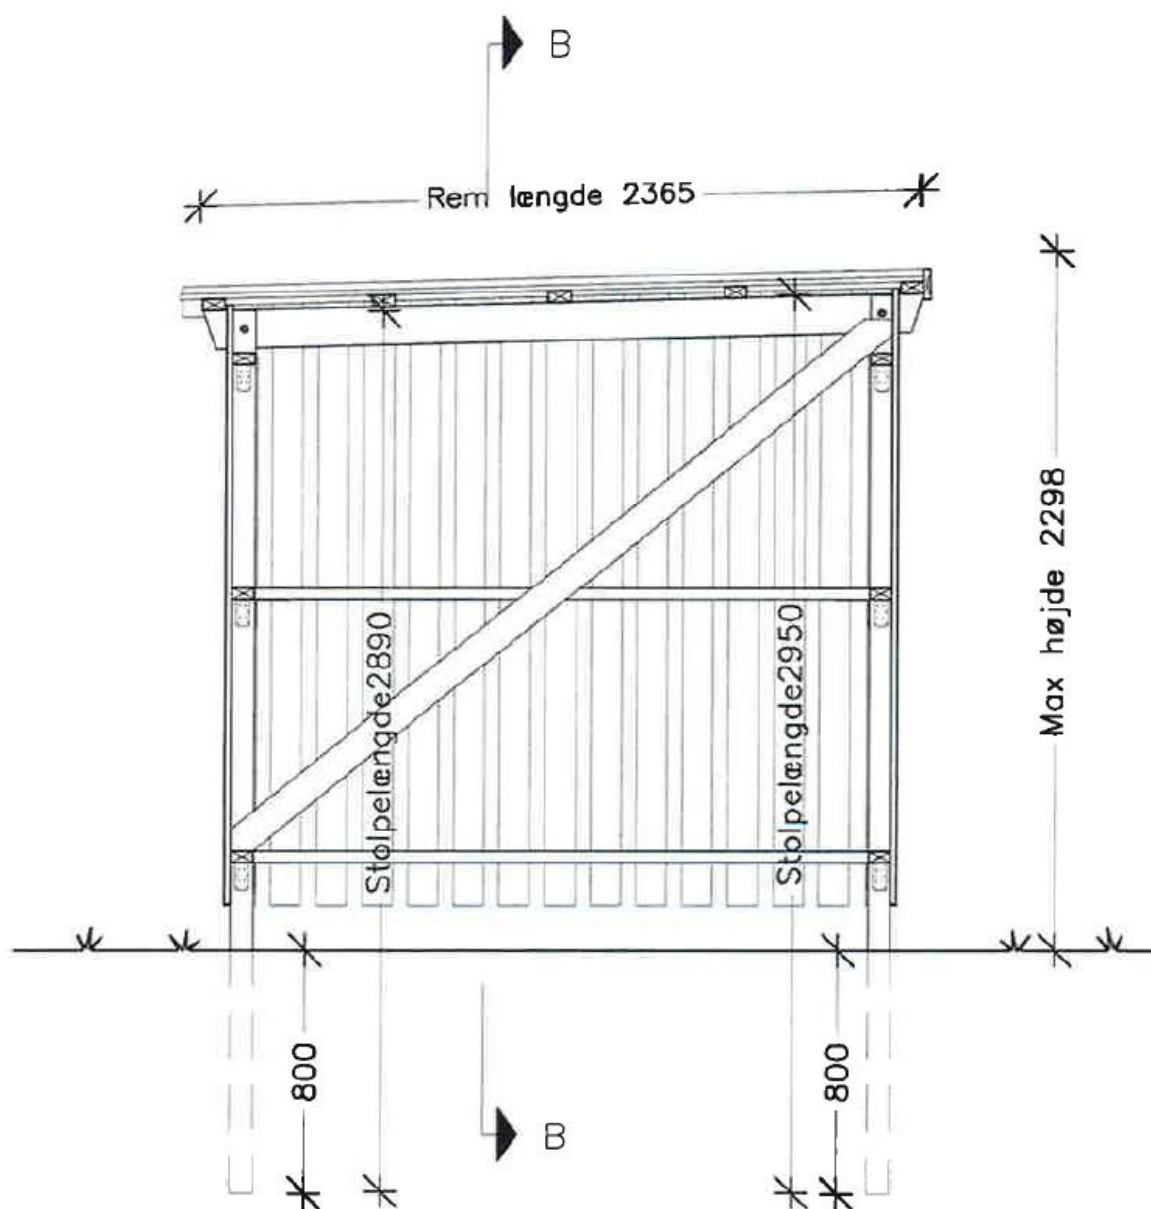

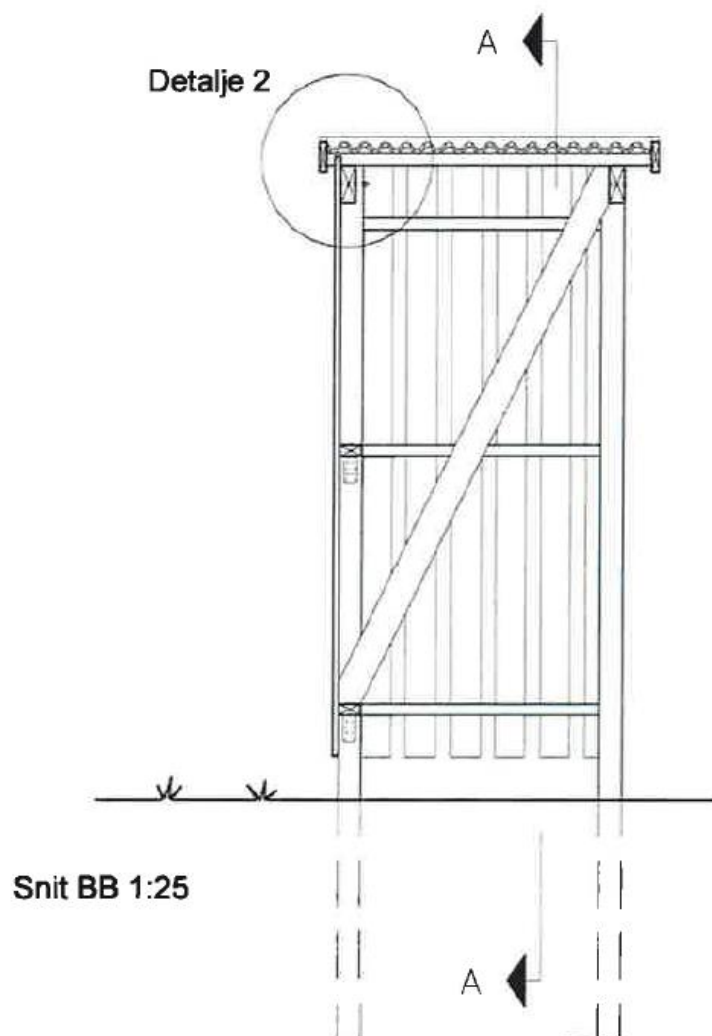


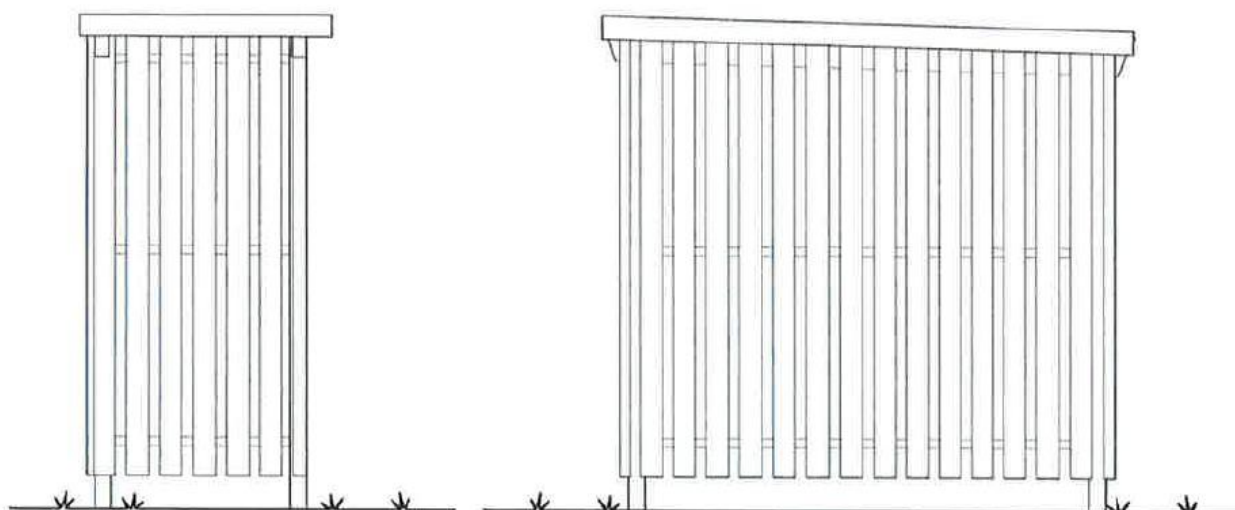


Facade

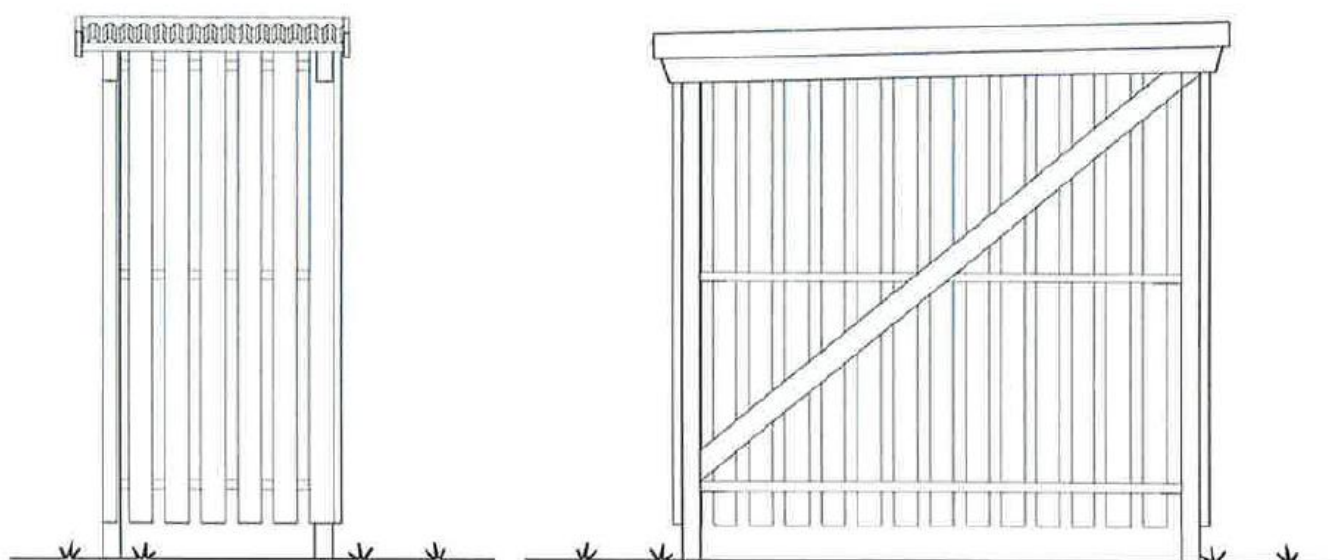

Facade

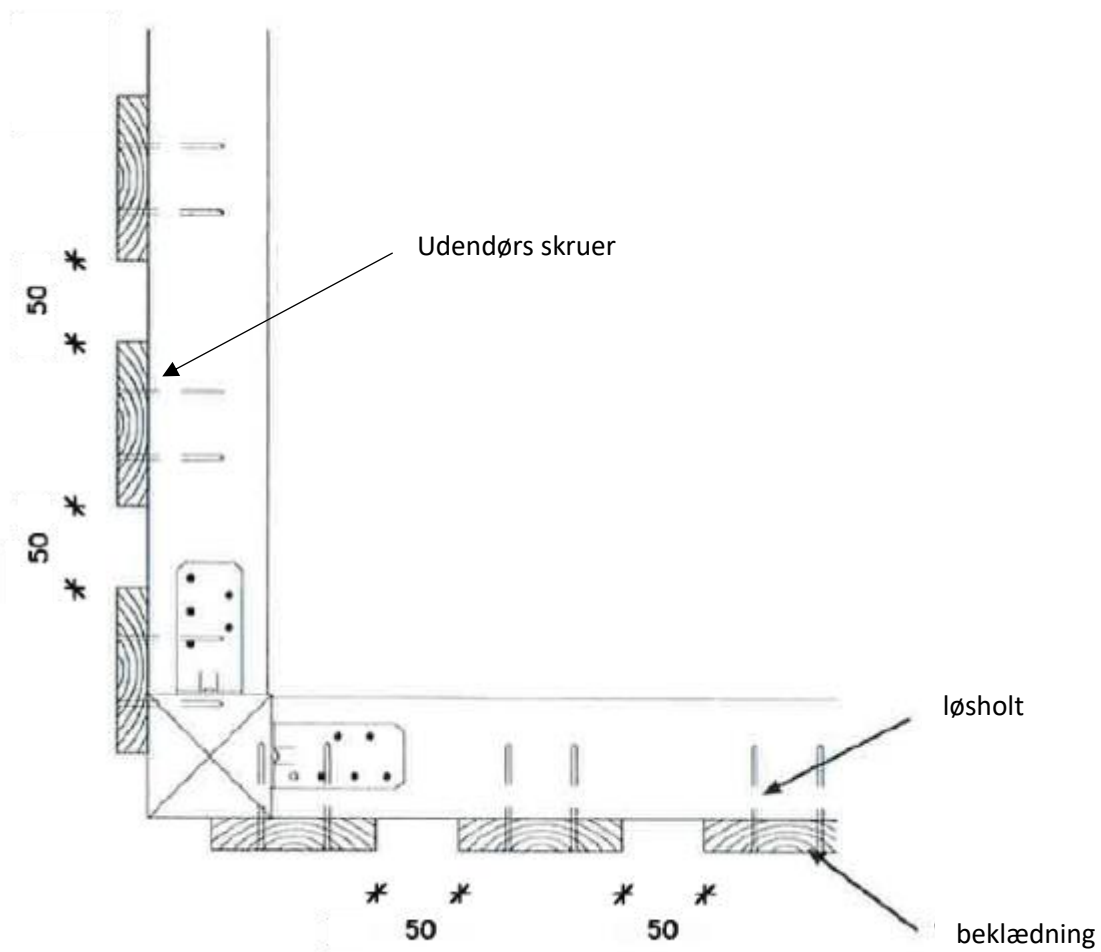

Detalje 1

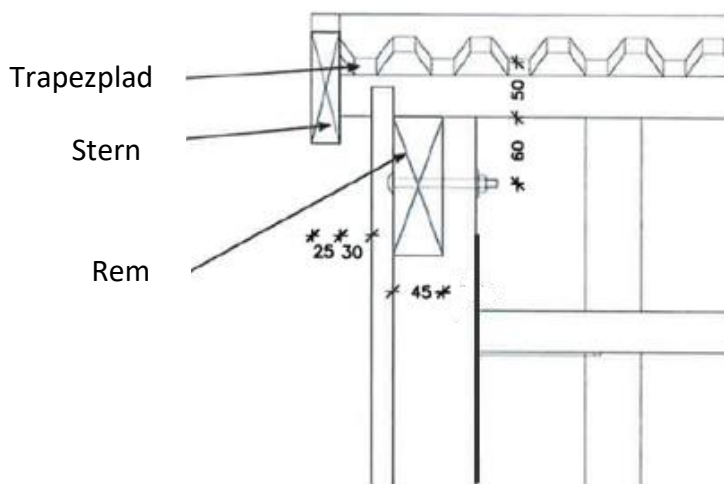

Detalje 2

Bemærk: at træ er et naturprodukt som udvider og trækker sig samme i forhold til luftfugtigheden, hvilket kan medføre revner og vindridser i overfladen. Dette er uden betydning for holdbarheden og er derfor ikke reklamlationsberettiget.

Vær venligst opmærksom på, at projektmaterialet er at betragte som vejledende. Det er alene bygherren, der er ansvarlig for, at opførelsen af nærværende projekt overholder den til enhver tid gældende miljø- og byggelovgivning, lokalplaner, servitutter, normer, anvisninger fra Arbejdstilsynet mv.

MONTERINGSVEJLEDNING AF PLASTMO TRAPEZPLADER

1. Pladen skal være 5 cm længere end konstruktionen. Evt. afkortning af pladerne foretages med en fintandet sav.
2. Vi anbefaler montage med bundskruer uden for boring jf. nedenstående skitse.
3. Fastgør skruer i hver 2. bølgedal på nederste og øverste spær. I spærerne mellem nederste og øverste lægte skrues i hver 3. bølgedal (ca. 10-12 skruer pr. m².)

Bemærk: Sne skal fjernes fra taget ved større snefald.

